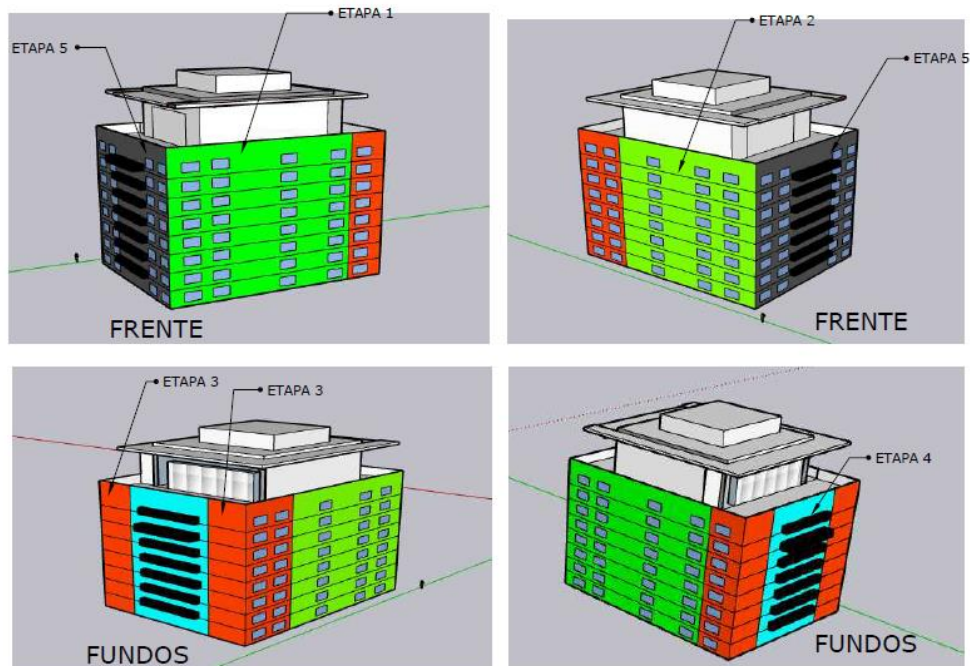


CRONOGRAMA DE OBRAS (BLOCO B)

ATIVIDADE	INICIO	TERMINO	PREDECESSORA
Início da etapa 4 no desenho técnico, onde há regiões de jardineiras voltada para o fundos do edifício.	08/07/2024	22/07/2024	Continuidade na região de etapa 3 (coluna 4), com instalação de andaimes fachadeiros nesta região.
Continuidade na região de etapa 3 (coluna 4), com instalação de andaimes fachadeiros nesta região.	23/07/2024	24/08/2024	Início da região 5, frontal para os fundos do bloco 1 (coluna 1).
Início da região 5, frontal para os fundos do bloco 1 (coluna 1).	25/08/2024	09/09/2024	Continuidade na região 5 abrangendo as região de (coluna 2)
Continuidade na região 5 abrangendo as região de (coluna 2)	10/09/2024	25/09/2024	Acabamentos finais na região de térreo e de modo geral com finalização de drenos.
Acabamentos finais na região de térreo e de modo geral com finalização de drenos.	26/09/2024	28/09/2024	Entrega do bloco.

Obs: Todas as etapas compreendem a recuperação de fachada com serviço de alpinismo, renovação de revestimentos, pintura, lavagem, entre outros.

BLOCO B

Carlos Augusto Gonçalves Junior
Engenheiro Civil CREA RJ nº 2020100367
