DATA DE HOJE	26/11/2024
PROJEÇÃO FUTURA	25/12/2024



CADASTRAR FERIADOS

TOTAL ORÇADO	TOTAL REAL	TOTAL DESVIO
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO ÍNICIO DO PROJETO	25/11/2024
TRABALHA SÓ DIAS ÚTEIS?	SIM
TRABALHAR SÁBADOS?	NÃO

LEGENDA
CRONOGRAMA
FIM DE SEMANA
FERIADOS
PROJEÇÃO
LINHA DE BASE

TÉRMINO PREVISTO	DIAS DE ATRASO
09/12/2024	0

ADICIONAR LINHA DE BASE
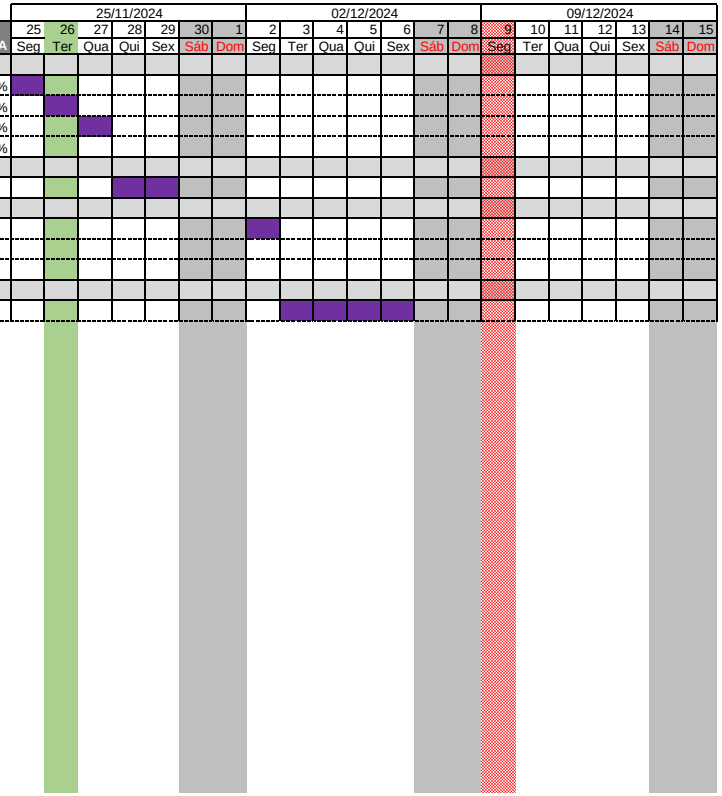
TIPO	Nº	TAREFAS	DURAÇÃO (DIAS)	ÍNICIO	TÉRMINO	PREDECESSORAS	VALOR ORÇADO	CUSTO	DESVIO	% FINALIZADA
E	1	**ATIVIDADES PRELIMINARES Tempo estimado 3 dias**								
	2	Fechamento do portão com madeirite	1	25/11/2024	25/11/2024					100%
	3	Quebrar o piso para aderência	1	26/11/2024	26/11/2024	2				100%
	4	Preenchimento com entulho	1	27/11/2024	27/11/2024	3				30%
	5	Colocação de bloco para concretagem	0	28/11/2024	27/11/2024	4				100%
E	6	**CONCRETAGEM tempo estimado 2 dias**	**0**			**5**				
	7	Entrega de materiais: 10 sacos de Cimento; 50 sacos de areia 20kg; 50 sacos	2	28/11/2024	29/11/2024	6				
E	8	**DESMONTAGEM E LIMPEZA tempo estimado 1 dia**				**7**				
	9	Retirada dos madeirites	1	02/12/2024	02/12/2024	8				
	10	Retirada de entulho	0	03/12/2024	02/12/2024	9				
	11	Lavagem e entrega da obra	0	03/12/2024	02/12/2024	10				
E	12	**secagem do concreto**	**0**			**11**				
	13	Secagem do concreto	5	03/12/2024	09/12/2024	11
